

FECHA DE EMISIÓN:

18/02/2026

RFI N°:

3152CCP-AH-CC-DA-RFI-006

1.0 DATOS GENERALES

Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC

PARA:

Empresa: Ludgar Aparicio (CCP)

DE:

Empresa: Alex Quispe Masias (CCP)

2.0 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar)

2.1 Planos(s) de referencia:	Revisión:	Código:
Criterios de Diseño - Electricidad	0	P22114-DA-3000-07-DC-001
TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2)	C	P22-DA-3300-07-GL-002
TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2)	C	P22-DA-3300-07-GL-003
TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2)	C	P22-DA-3300-07-GL-004
TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2)	C	P22-DA-3300-07-GL-005
ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (1 DE 4)	C	P22-DA-3000-07-RD-008

3.0 INFORMACIÓN SOLICITADA

3.1 Título: DETALLE DE INSTALACIÓN POZOS A TIERRA

3.2 Disciplina: Electricidad

3.3 Área: 3300

3.3 Descripción:

Según planos de puesta a tierra P22-DA-3300-07-GL-002_Rev.C @ 005_Rev.C hace referencia al estándar constructivo P22-DA-3000-07-RD-008_C (Detalle 1 y Detalle 2) para instalar los pozos a tierra con caja de registro y pozos sin cajas de registro.

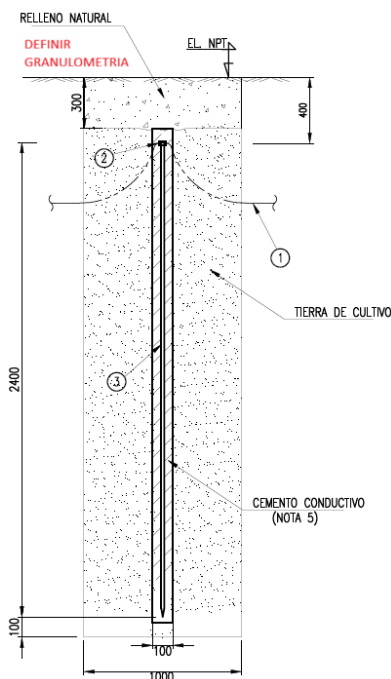


Imagen 1

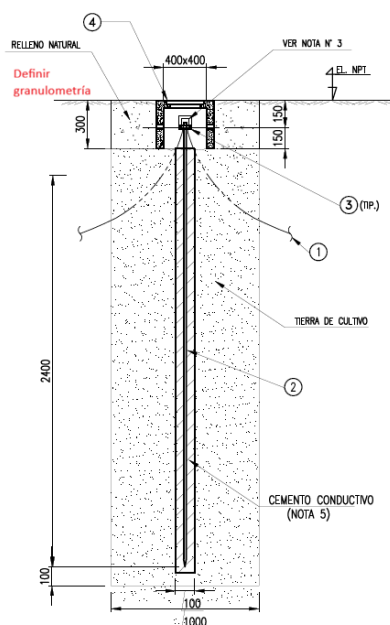


Imagen 2

	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 2 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

Por lo mencionado solicitamos atender las siguientes consultas.

- 1.- Definir la granulometría del material de relleno natural en la ultima capa de 300 mm, mencionado en los pozos con caja de registro y pozos sin caja de registro. (Ver imagen 1 e imagen 2).
- 2.- Indicar el valor aceptable (ohmios) para la medición de los pozos individuales.
- 3.- Confirmar la emisión de estándares constructivos para instalar pozos horizontales.

3.4 Propuesta de la solicitud:

3.5 Fecha de respuesta requerida: 22/02/2026

4.0 RESPUESTA

Respondido por:
Cargo:

Fecha:

Aprobado por:
Cargo:

Fecha:
